

Laporan Bimbingan Tugas Akhir

NIM	2305551076
Nama	Ravi Arnan Irianto
Bidang Keahlian	Network and Cloud Computing
Mata Kuliah	Proyek 1
Judul	Implementasi Sistem SOAR Open-Source Berbasis n8n untuk Deteksi dan Respons Ancaman Malware dan Phishing dengan Mitigasi Aktif Human-in-the-Loop (Studi Kasus: CV Bali Handmade)
Dosen Pembimbing	1. Ir. I Nyoman Piarsa, ST., MT., IPM. 2. A.A. Kt Agung Cahyawan Wiranatha, S.T., M.T.

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan laporan bimbingan Tugas Akhir yang memuat tiga hal: tindak lanjut atas arahan bimbingan pada tanggal 3 September 2026, perkembangan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 8 Oktober 2026, serta perbandingan capaian terhadap milestone yang telah disusun pada awal semester. Laporan ini dilampiri bukti pelaksanaan berupa kode, pengujian, dan hasil pengukuran pada sistem yang berjalan (live).

Sistem telah dijalankan secara langsung pada lingkungan uji dan diuji secara menyeluruh dari hulu ke hilir (end-to-end). Seluruh milestone yang jatuh tempo pada periode ini telah diselesaikan, dan beberapa milestone berikutnya telah berjalan lebih awal dari jadwal.

2. Tindak Lanjut Arahan Bimbingan

Arahan yang diberikan pada bimbingan tanggal 3 September 2026 beserta tindak lanjutnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Tindak lanjut arahan bimbingan 3 September 2026

Arahan	Status	Bukti
Revisi diagram: n8n sebagai mesin orkestrasi pusat dan alur yang eksplisit	Selesai	docs/ARCHITECTURE.md, docs/FLOW.md, docs/diagrams/arsitektur-soar.png
Dokumentasi format pertukaran data JSON (skema disepakati)	Selesai	docs/ARCHITECTURE.md (skema payload)
Perluasan cakupan pemantauan: perangkat USB dan perpindahan berkas	Selesai	Agen Rust memantau Downloads, Desktop, dan /run/media (rekursif, auto-unwatch)
Purwarupa agen ringan (saran pembimbing: Go)	Selesai	agent-rs/ (Rust, ~5,3 MB; RSS ~5,2 MB vs agen Wazuh ~50 MB); alasan pemilihan Rust pada docs/AGENT-RINGAN.md
Skenario laporan gaya bahasa awam (100 workstation + human-in-the-loop)	Selesai	docs/diagrams/fig-karyawan-*, narasi bab 1 laporan
Pemeriksaan tata bahasa dan kejelasan laporan per paragraf	Berjalan	docs/Laporan-SOAR.md (revisi berkelanjutan)
Progres mingguan dan demo (1 server + beberapa klien)	Berjalan	Sistem live: siap 100 workstation, dashboard web + TUI, armada 7 endpoint

3. Perkembangan Pelaksanaan

Sejak bimbingan terakhir, pekerjaan difokuskan pada keandalan dan keamanan platform, perluasan sumber intel, serta penyediaan bukti kuantitatif. Perkembangan tersebut dirangkum sebagai berikut.

a. Keandalan dan keamanan platform.

1. n8n dinaikkan dari versi 2.40.0 ke 2.42.5, menutup kumpulan kerentanan (CVE) yang dirilis Oktober 2026, termasuk dua kerentanan berkategori kritis (CVE-2026-103255 dan CVE-2026-103248).
2. Wazuh dinaikkan dari versi 4.10.5 ke 4.14.8. Proses dilakukan berurutan (indexer, manager, dashboard); cluster indexer kembali berstatus hijau, data dan identitas cluster tetap terjaga, aturan kustom tetap utuh, dan agen tetap terhubung.

b. Perluasan sumber threat intelligence.

1. Cache verdict VirusTotal dengan masa berlaku (TTL) diferensial serta penggabungan sumber kedua (MalwareBazaar) telah aktif.
2. MISP ditambahkan sebagai sumber intel keempat melalui feed OSINT komunitas (format MISP) tanpa memerlukan kunci API. Pengujian end-to-end menunjukkan berkas yang hanya dikenal MISP (tidak dikenal VirusTotal maupun MalwareBazaar) berhasil dinaikkan tingkat keparahannya menjadi TINGGI, sehingga menutup celah luput deteksi (false-negative).

c. Keterangan dan keteramatan (explainability dan observability).

1. Setiap notifikasi memuat alasan keputusan dan jejak audit, disertai penandaan saat deteksi berada dalam kondisi terdegradasi.
2. Ditambahkan pencatat notifikasi Telegram keluar, karena API Telegram tidak menyediakan riwayat pesan keluar; setiap notifikasi yang benar-benar terkirim dicatat lengkap (tingkat keparahan, agen, hash, dan identitas pesan).

d. Perbaikan kualitas keputusan. Keputusan "malware" kini berbasis indikator threat intelligence, bukan semata tingkat aturan FIM; berkas konfigurasi sistem dan berkas jinak tidak lagi memicu notifikasi keliru (false positive).

4. Capaian terhadap Milestone

Perbandingan capaian terhadap tujuh milestone Semester 7 disajikan pada Tabel 2. Bobot ketujuh milestone diasumsikan setara, dan angka capaian disusun berdasarkan bukti artefak (kode, pengujian, dan hasil pengukuran), bukan perkiraan.

Tabel 2 Capaian terhadap milestone Semester 7

No	Milestone	Target	Capaian	Keterangan / Bukti
M1	Konsolidasi purwarupa dan lingkungan uji	Agustus 2026	100%	Selesai: perbaikan keandalan tuntas, konfigurasi ter-version-control, prosedur pengujian baku
M2	Perluasan verifikasi ancaman multi-sumber	September 2026	100%	Selesai: MalwareBazaar, deteksi berkas eksekutabel, pemindaian ulang terjadwal, dan MISP aktif
M3	Penyempurnaan respons berjenjang berbasis keyakinan	Oktober 2026	85%	Jalur human-in-the-loop berjalan; sisa: dokumen matriks keyakinan terhadap aksi

No	Milestone	Target	Capaian	Keterangan / Bukti
M4	Integrasi analisis LLM dan explainability	Oktober 2026	80%	Integrasi LLM, keterjelasan, dan jejak audit berjalan; sisa: pengujian konsistensi keluaran LLM
M5	Pengerasan keamanan dan reproduksibilitas	November 2026	60%	Infrastructure as Code dan penggelaran idempoten selesai; sisa: pembatasan firewall dan penggantian kredensial bawaan
M6	Pengujian dan evaluasi kuantitatif	Nov–Des 2026	90%	$N \geq 30$, uji beban, laju false-negative, pemetaan MITRE ATT&CK, serta MTTR human-in-the-loop dan cache telah diukur
M7	Penyusunan laporan dan seminar Proyek 1	Des 2026–Jan 2027	50%	Draf laporan berjalan; seminar akhir belum dilaksanakan

Rata-rata capaian ketujuh milestone adalah **sekitar 81%**. Dengan mengacu jadwal, pada awal Oktober seharusnya baru milestone M1 dan M2 yang tuntas serta M3 dan M4 sedang berjalan; kenyataannya M5 dan M6 telah berjalan lebih awal. Dengan demikian pelaksanaan berada **lebih cepat dari jadwal**.

5. Hasil Pengukuran

Ringkasan hasil pengukuran kuantitatif pada sistem disajikan pada Tabel 3. Seluruh angka diperoleh dari sistem yang berjalan, bukan estimasi.

Tabel 3 Ringkasan hasil pengukuran

Metrik	Hasil	Keterangan
MTTR malware (isolasi otomatis)	1,68 detik (N=15)	Ujung ke ujung, cache VirusTotal hangat
MTTR ujung ke ujung (via fleet-log)	3,00 detik (N=30)	Injeksi sampai verdict tercatat
MTTR human-in-the-loop, notifikasi	21,05 detik (N=5)	Injeksi sampai notifikasi Telegram bertombol (~18 detik di antaranya biaya LLM)
MTTR human-in-the-loop, eksekusi AR	0,07 detik (N=5)	Setelah keputusan sampai perintah Active Response
Throughput	34 alert/detik (N=20)	Uji beban pada webhook
Laju false-negative	0,0% (N=15)	Seluruh berkas berisiko berhasil terdeteksi
Penekanan false-positive	100% (N=8)	Delapan alert dasar menjadi nol notifikasi

6. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut penyusunan Tugas Akhir setelah laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Menyusun dokumen matriks keyakinan terhadap aksi sebagai formalisasi respons berjenjang (melengkapi M3).
2. Melakukan pengujian konsistensi keluaran LLM pada alert yang identik (melengkapi M4).
3. Menyelesaikan pengerasan operasional: pembatasan firewall dan penggantian kredensial bawaan (melengkapi M5).
4. Menyiapkan bukti laporan berupa tangkapan layar dashboard dan notifikasi serta draf bab hasil (menuju M7).

7. Penutup


Demikian laporan bimbingan ini disampaikan. Sistem telah berjalan dan teruji, serta capaian pelaksanaan berada lebih cepat dari jadwal. Besar harapan atas koreksi dan arahan dari Bapak untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

8. Lampiran

Sebagai bukti pelaksanaan bimbingan, dilampirkan tangkapan layar sesi bimbingan bersama kedua dosen pembimbing.



Gambar 1 Bimbingan Pembimbing 1 (Ir. I Nyoman Piarsa) via Zoom.

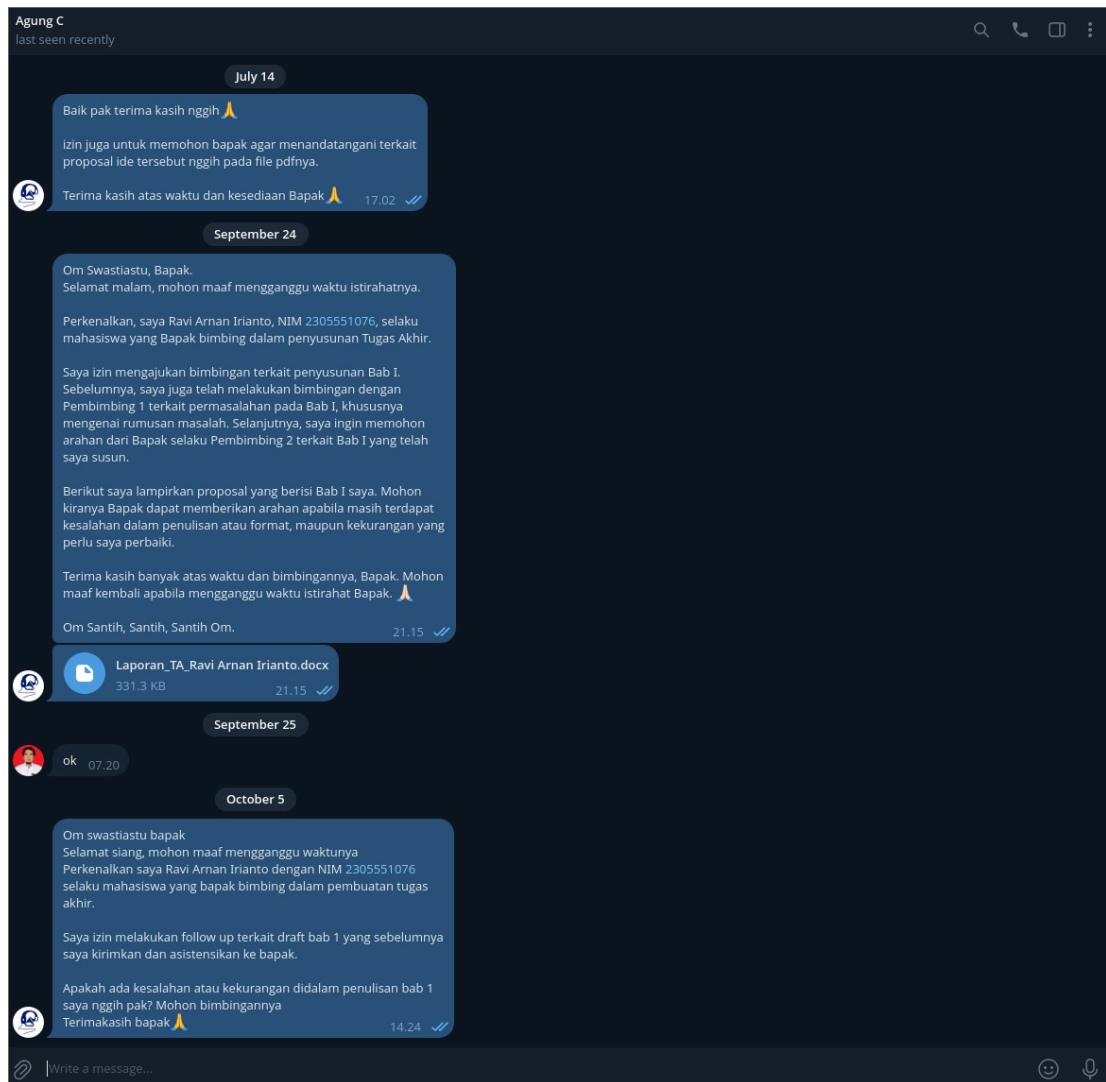

Gambar 2 Bimbingan Pembimbing 2 (A.A. Kt Agung Cahyawan Wiranatha) via Telegram.
